



Regie onder hoogspanning

De groeiende rol van provincie en Rijk bij uitbreiding van het hoogspanningsnet



- Knelpunten in besluitvorming over netuitbreidingen van het nationale hoogspanningsnet (110 kV en hoger)
 - Rol provincies en Rijk – focus op rol als bevoegd gezag RO
 - Samenwerking met gemeenten en netbeheerders
- › *Luuk van Dijk met gastsprekers Mischa Jansen en Yvan Vavier*



Belangrijke knelpunten



Vertraging door onduidelijkheid over **bevoegd gezag** (110-150kV soms voor 12+ maanden) en **locatiekeuze**



Hoge procedurele eisen creëren langere doorlooptijden dan netcongestie toelaat, met weinig verschil tussen nieuwbouw en uitbreiding



Beperkt draagvlak door impact op leefomgeving vergroot kans op vertraging in procedure



Werkwijze TenneT nu sequentieel en risicomijdend.



Belangrijke knelpunten



Vertraging door onduidelijkheid over **bevoegd gezag** (110-150kV soms voor 12+ maanden) en **locatiekeuze**



Hoge procedurele eisen creëren langere doorlooptijden dan netcongestie toelaat, met weinig verschil tussen nieuwbouw en uitbreiding



Beperkt draagvlak door impact op leefomgeving vergroot kans op vertraging in procedure




Werkwijze TenneT nu sequentieel en risicomijdend.



Landelijk hoogspanningsnet

- 110 kV en hoger
= nationaal belang
- 220 kV en hoger
= minister KGG bevoegd gezag
- Dus 110 & 150 kV
= gemeente bevoegd gezag

Provincie: regie op integraal programmeren met gemeenten
> pMIEK

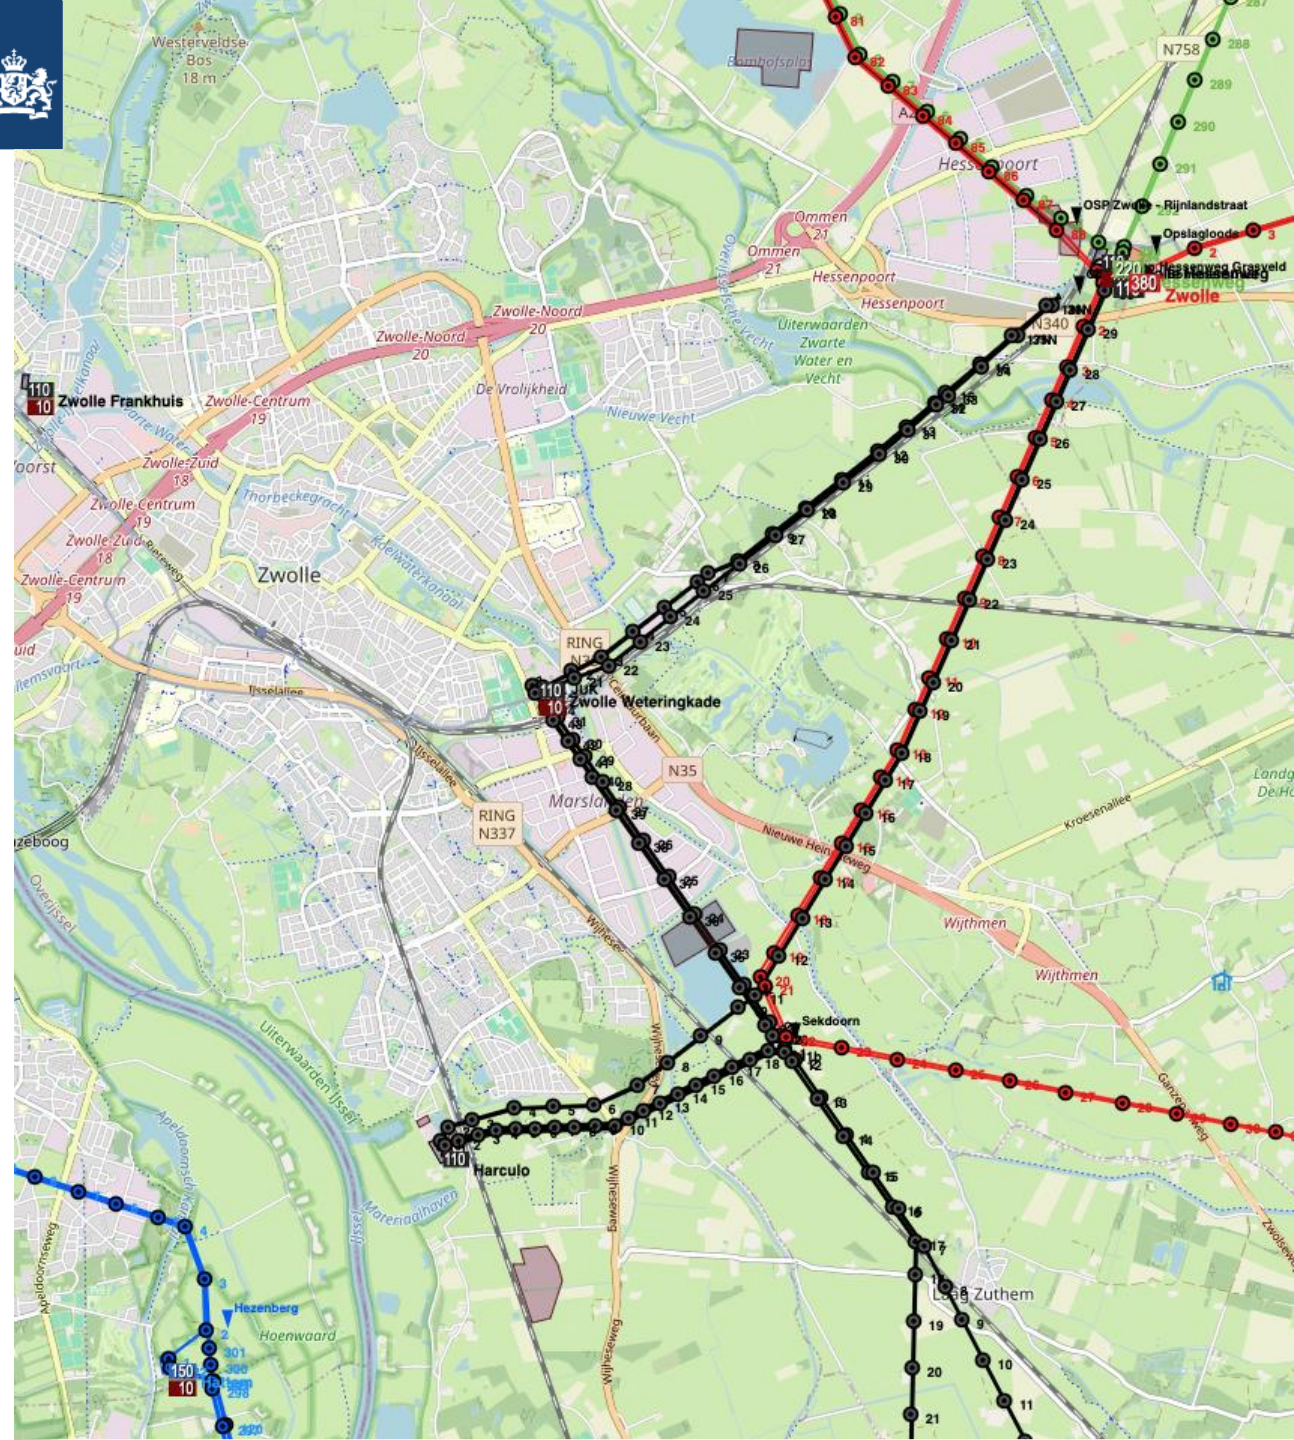



Onduidelijkheid bevoegd gezag?

- › Diverse redenen om af te wijken van wettelijke uitgangspunt bevoegdheidsverdeling

Subsidiariteitsbeginsel:


Een bestuursorgaan van het Rijk / provincie oefent een taak of bevoegdheid, als dat bij de regeling daarvan is bepaald, alleen uit als dat nodig is met het oog op een nationaal / provinciaal belang en dat belang niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door het provinciebestuur of gemeentebestuur kan worden behartigd



PROVINCIE  UTRECHT

Bevoegd gezag rol provincie Utrecht

NP RES Congres
29 oktober 2025
Mischa Jansen – Sr. projectmanager
energie infrastructuur - Team Netcongestie

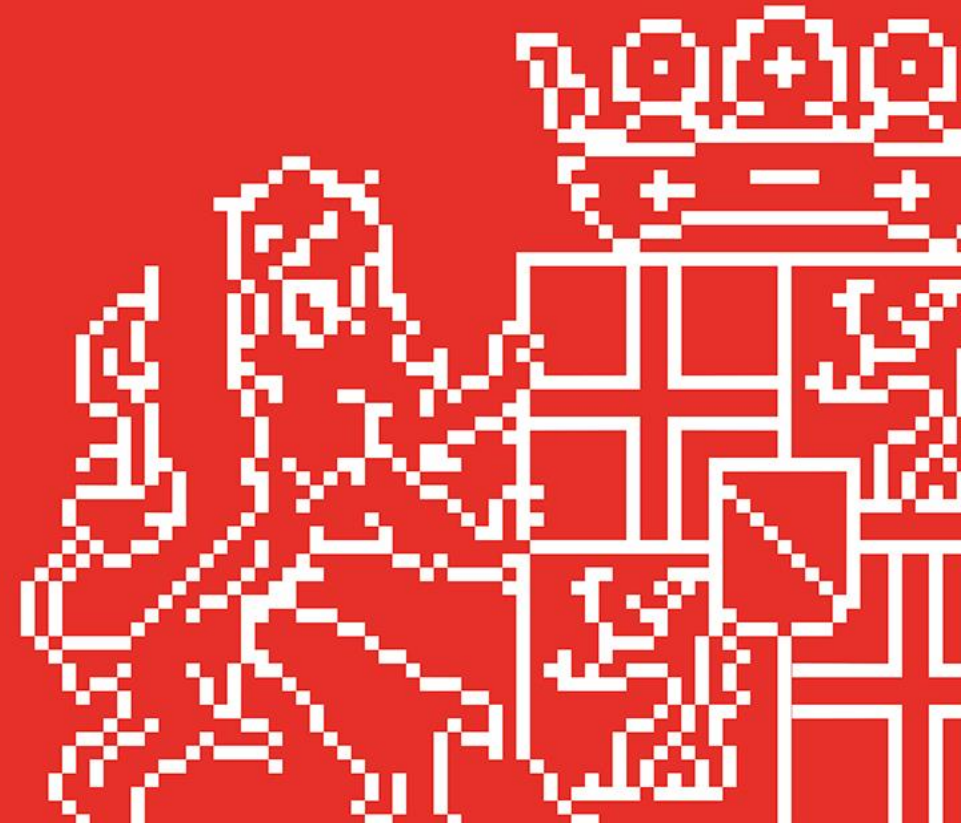



Uitgangspunten

- Bevoegd gezag in de basis bij het Rijk of gemeenten
- Provincie is betrokken vanuit de pMIEK, projecten hebben provinciaal belang (zoals Utrecht Noord en Amersfoort Noord)
- Voorzitter van de Energy Board (EB) – sturing op netuitbreidingen
- Toetsing ruimtelijke ontwikkelingen aan onze omgevingsverordening
- Vergunningverlening voor soortenbescherming en natura2000 (stikstof)



Start van projecten

- De netbeheerders bepalen een hoofdzoekgebied, vaak twee of meer gemeenten betrokken. Er start een projectteam zonder centraal bevoegd gezag.
- Partijen definiëren gezamenlijk potentiële locaties binnen het zoekgebied, dit gaat vaak goed!
- De potentiële locaties worden in opdracht van de netbeheerder door een externe partij beoordeeld.

En dan...

- Er is geen consensus over de beoordeling of deze wordt in twijfel getrokken. Er kan niet worden geparticipeerd want er is geen doorslaggevend bevoegd gezag, de voortgang stagneert.



Wat nu?

- Partijen komen er niet uit en een impasse dreigt, netbeheerders concluderen dat het project in de vertraging schiet en vragen hulp aan de provincie, al dan niet via de EB.
- Provincie kan, bij uitzondering, besluiten om het bevoegd gezag naar zich toe te trekken maar wil zoveel als mogelijk de door de wetgever bedachte rol in stand houden.



- Netbeheerder verzoekt het college van GS met klem om in te grijpen.
- Het college consulteert betrokken gemeenten en evt. andere netbeheerder.
- Afweging vindt plaats van bestuurlijke zelfbeschikking in relatie tot het provinciale belang. Voldoen we aan alle eisen en is er voldoende reden om het initiatief over te nemen (*subsidiariteitsbeginsel, doelmatigheid*)?
- In mei 2025 heeft college van GS besloten om een projectprocedure te willen doorlopen voor dit project
- Doorlooptijd ca. 2 á 3 maanden



Aandachtspunten


- Het is een uitzondering om de BG rol over te nemen.
- Het overnemen van een bevoegdheid van een gemeenteraad heeft impact, zeker wanneer het station in die gemeente lijkt te landen.
- Verhoogde werklust binnen eigen organisatie.
- Lokale belangen zijn onverminderd relevant en dienen zoveel mogelijk te worden gewaarborgd bij nadere keuzes door het bevoegd gezag.



PROVINCIE  UTRECHT

Dank voor uw aandacht
VRAGEN?

Mischa.jansen@provincie-utrecht.nl

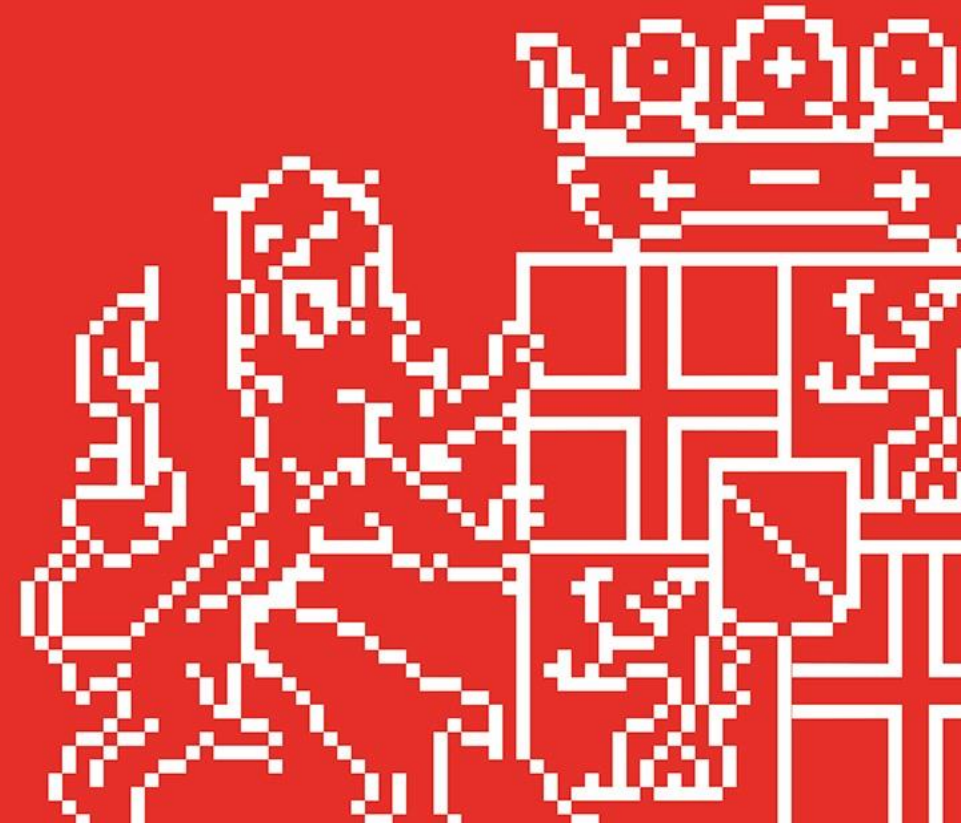



Omgevingsvisie Limburg

Bevoegd gezag Energie-Infrastructuur

Yvan Vavier – Cluster Ruimte - yjp.vavier@prvlimburg.nl

Congres Regionale Energie en Lokale Warmte – 29 oktober 2025

provincie
Limburg



Limburg en Energie

- Mijnverleden: Limburgs DNA -> Energie brengt welvaart
- Energie-intensief bedrijfsleven: Chemelot, glastuinbouw
- Besef dat toegang tot betaalbare energie van wezenlijk belang is
- Meer regie op de ruimte, daarom ook meer provinciale inzet op de ruimtelijke inbedding van energie (gebruik, infrastructuur, opslag en opwek)
- “Energieplanologie” geïntroduceerd in Omgevingsvisie:

Strategische (bestuurlijke) afwegingen maken over aanbod, vraag, transport en opslag van energie, gepland in de tijd en ruimte.



Limburg en bevoegd gezag energie-infra

- Meer regie op de ruimte: dan ook je verantwoordelijkheid nemen en de beschikbare instrumenten daarvoor inzetten.
- Beleidsmatige grondslag in Omgevingsvisie (§ 9.3)

“In samenwerking met de betreffende gemeenten, TenneT en Enexis bekijken we met welke procedures de benodigde toestemmingen voor deze verzwaren het snelste verkregen kunnen worden, met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid. Mocht ons ruimtelijk instrumentarium hiervoor het meest geschikt zijn, dan maken we hiervan gebruik. Vaak betreft dit 150 kV-verbindingen die door meerdere gemeenten lopen. Voor een wijziging van het omgevingsplan is één ruimtelijke provinciale procedure doeltreffender en efficiënter dan afzonderlijke procedures in elke gemeente. Onze kosten voor de procedure borgen we via een anterieure overeenkomst.”

- Omgevingsvisie is ruimtelijke vertaling van Energiebeleid: onder meer Energievisie 1.0 en Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat



Praktisch - I

- Zo vroeg mogelijk het gesprek aangaan over bevoegd gezag (eerste gesprekken projecten maatregelenpakket tonen meteen meerwaarde)
- Expliciete schriftelijke steun vragen aan College van B&W voor provinciale rol, ook bij overname van het Rijk.
- Tijdservaring: 4 maanden
- Provinciale verantwoordelijkheid, maar wel voor en in afstemming met gemeenten: samenwerken.
- 2 Projectprocedures zijn lopende:
 - *Verzwarend 150 kV naar 380 kV Maasbracht – Enighausen (Chemelot)*
 - *150 kV verbinding Venray – Energielandgoed Wells Meer*
- 1 Projectprocedure in concrete voorbereiding:
 - *Verzwarend en vernieuwing 150 kV verbinding Graetheide - Schoonbron*



Praktisch - II

- Projectenpagina

[Actuele projecten - Provincie Limburg](#)


- Sondering Provinciale Staten

[Document Limburg - Sonderend stuk inzake bevoegd gezag en opstarten projectprocedure Aansluiting Energielandgoed Wells Meer \(ELWM\) in de gemeente Bergen, brief GS van 18-3-2025 \(GS DOC-00760846\) - iBabs Publieksporaal](#)


[Document Limburg - Sonderend stuk Opwaardering 380 kV Maasbracht - Graetheide, brief GS van 31-10-2023 \(GS DOC-00568396\) - iBabs Publieksporaal](#)

- Omgevingsvisie Limburg

www.polviewer.nl

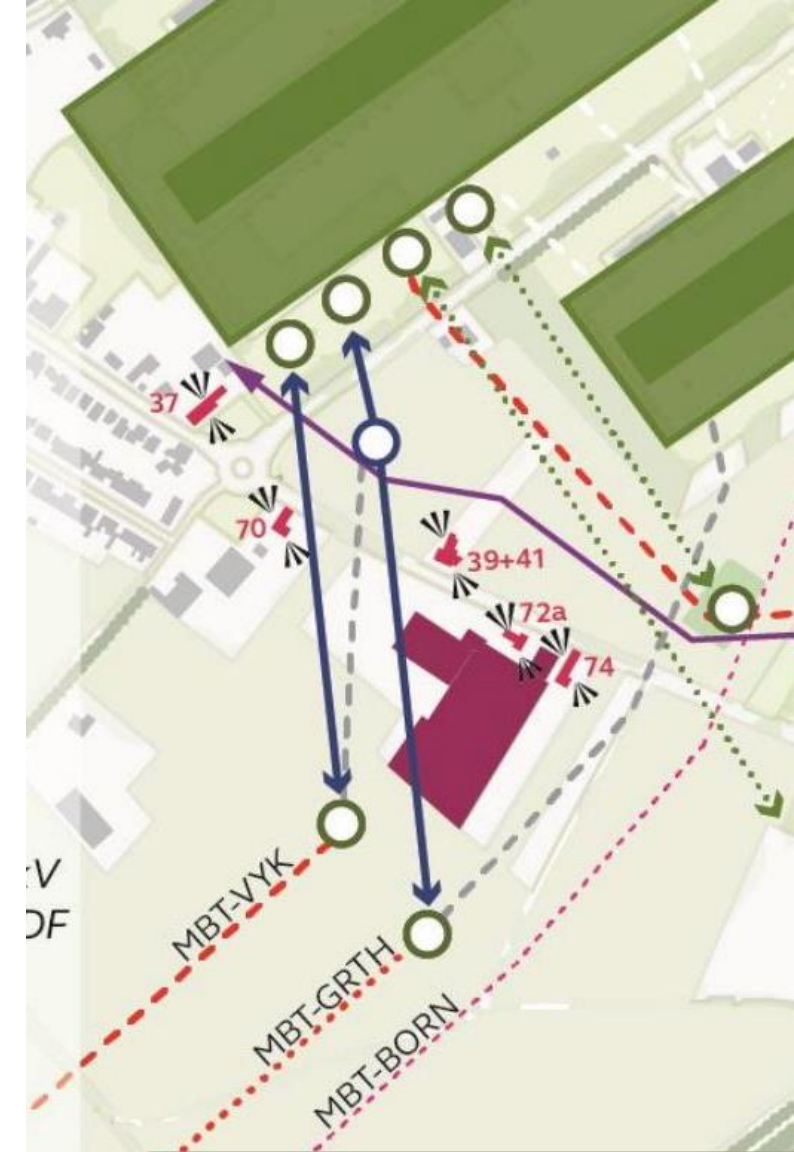

provincie
Limburg



Volg ons op





Afsluiting

- › Maatregelenpakket sneller uitbreiden elektriciteitsnet
- › www.rvo.nl/netcongestie
- › [Kenniscommunity netcongestie](#)
- › Vragen? l.vandijk@minezk.nl





Ministerie van Klimaat en
Groene Groei



Expertpool Energie-Infrastructuur/ Vliegende brigade

- Projectmatige ondersteuning aan gemeenten en provincie
- Expertise en capaciteit op gebied van RO
- Leereffect: spreiding kennis en ervaring binnen decentrale overheden in Nederland

Welke ondersteuning is mogelijk?

- Projectleider ruimtelijke module of vergunningenmodule
- Omgevingsjurist omgevingsplanwijziging of provinciale projectprocedure
- Projectadviseur met technisch inhoudelijke kennis
- Procesmanager





Expertpool Energie-Infrastructuur/ Vliegende brigade

- **Voor vragen of gesprek:** neem contact op met Thomas of Jeroen of informeer via KGG
- **Mail:** expertpoolmiekenpeh@rvo.nl



Jeroen Bijleveld
(Coördinator)
06 – 4692 0181
Jeroen.Bijleveld@rvo.nl



Thomas de Meijer
(Projectleider)
06 – 2142 3122
Thomas.demeijer@rvo.nl

